

LLM 기반 IP 개발 시스템 「글도비」 프로젝트 승인 요청서_1차

문서 번호: BIZ-2026-001-REV1

작성일: 2026-03-15

작성자: 조원재

목적: 임원 30초 판단용 1페이지 요약 + 재무/기술 방어용 상세 문서

1. 1페이지 요약

먼저 보는 전제

2026년 최소 생산 목표 작품 = 27개다. 이 승인서는 월 3작품 x 9개월 = 총 27작품을 기준 단위로 비용, 매출 분위, 회수 가능성을 읽는 27작품 포트폴리오 승인서다. 개별 작품 1개의 손익 추정서가 아니다.

1. 무엇을 승인해 달라는가

LLM 기반 IP 개발 시스템 「글도비」를 개인·사비 개발 체계에서 회사 운영·회사 개발 체계로 전환하기 위한 운영 전환 1단계 승인을 요청한다. 요청 범위는 2026-04~12 기본 예산 약 2,200~2,900만원 + a 상한, Vertex AI 운영 계정·예산 한도·Batch API 활용 승인, 월 3작품 기준 MVP Validation 운영, 19금 성인 HL 요구 프로젝트 발생 시 선택적 Grok +a 예외 분기, 결과물 권리 구조와 운영 책임 체계 확정이다. 이 시스템은 소설을 대신 쓰는 AI가 아니라, IP를 대량으로 테스트하는 생산 인프라다.

항목	월 비용	검토 기간 합계 / 기준 단가	비고
운영용 개발/감리 툴 (Codex + Claude Code)	약 52만원 (\$400 수준)	약 520만원	전처리·유지·감리·교차검증
Vertex AI API	약 132~210만원	약 1,190~1,890만원	기본 생산비
개발비/서버비/기타	약 50만원	약 500만원	인프라·예비
Grok API(선택)	+a	+a	19금 HL 예외
합계	**약 234~312만원 + a**	**약 2,200~2,900만원 + a**	2026-04~12

2. 왜 천만 단위 예산인가

이 승인 범위는 작품 1개가 아니라 27작품 포트폴리오 운영 전환이다. 자사 내부 60개월 매출 추적 자료 기준 27작품 포트폴리오의 출시 후 12개월 누적 순매출 보수적 하한선(P25)은 약 4,503만원으로 기본 총원가 약 2,200~2,900만원보다 높다. 즉, 이번 예산은 완제품 구매가 아니라 검증 속도를 늦추지 않기 위한 운영 전환 비용이다.

3. 왜 지금 승인해야 하는가

1. 지금까지는 사실상 `Google API 범위 + 개인 부담 중심`의 `사비개발` 성격이 강했다. 이제 필요한 판단은 기능 추가가 아니라, 이 체계를 `회사 돈`, `회사 권한`, `회사 운영 책임` 아래로 올릴지 여부다.

2. 현재 단계는 `아이디어 탐색`이 아니라, `1 arc 기준선 + 10 arc 연속 통과`를 거친 `MVP Validation 진행 단계`다.

3. 미승인 시 `회사 자산화`, `Vertex AI` 기반 권한 통제·비용 귀속·운영 관측·`Batch API` 검증, 그리고 `4월 말 작품 생산 가능성 closure` 일정이 함께 밀린다.

목차

- 1. 1페이지 요약
- 2. 재무적 판단
- 3. 기술적 판단
- 4. 승인 조건 및 실행 계획
- 5. 부록

2. 재무적 판단

2.1 이 문서가 재무적으로 묻는 질문

이 승인요청서는 작품 1개가 바로 돈이 되느냐를 묻는 문서가 아니다. 이번 안건은 2026-04~12 동안 월 3작품, 총 27작품을 운영 가능한 회사 체계로 올릴 것인지 판단하는 문서다. 따라서 재무 판단 단위도 작품별 예상 대박치가 아니라 27작품 포트폴리오가 시장 기준선 대비 회수 가능한 구조인가로 읽는 것이 맞다.

즉, 재무팀이 봐야 할 질문은 아래 두 가지다.

- 1. 운영 전환 1단계 기본 총원가가 얼마인가.
- 2. 그 총원가가 내부 시장 자료 기준에서 완전히 분리된 무리한 숫자인가.

2.2 통계 자료는 어디서 나왔는가

통계의 원자료는 work_sales_monthly_60m.csv다. 이 데이터는 2021-02부터 2026-01까지 정확히 60개월의 월별 순매출 추적 원자료다. 여기서 승인 판단용 모집단은 아래 규칙으로 만들었다.

- 1. 출판사가 `포텐`, `올나이트노벨`, `프로무림`인 행만 남겨 남성향 모집단으로 사용했다.
- 2. 작품 단위 중복 왜곡을 줄이기 위해 `작품 + 작가` 기준으로 묶었다.
- 3. `첫 관측월 = 첫 판매월`로 간주한 보수적 전체 모집단을 메인 기준선으로 사용했다.
- 4. `12개월 관측 완료 작품 1,699개`를 모집단으로 두고 `27작품 포트폴리오`를 `20,000회` 무작위 샘플링해 분포를 추정했다.

실무상 재무 방어에 필요한 관련 파일명은 아래 네 개다.

- `work\_sales\_monthly\_60m.csv`
- `work\_sales\_monthly\_by\_work\_60m\_male\_only.csv`
- `work\_sales\_work\_profile\_male\_only.csv`
- `work\_sales\_roi\_portfolio\_baseline\_male\_only.csv`

이 문서는 추정 매출을 임의로 만든 것이 아니라, 내부 판매 이력에서 남성향 모집단을 분리해 포트폴리오 분포로 읽는 방식이다.

2.3 비용 구조는 어떻게 잡았는가

비용은 고정비, 운영형 변동비, 예외 비용, 실험성 비용으로 나눠 읽는 것이 맞다.

구분	기준	2026-04~12 합계	해석
Codex 구독	약 26만원/월	약 260만원	전처리, 리팩터, 유지
Claude Code Pro Max	약 26만원/월	약 260만원	감리, 교차검증
Vertex AI API	약 132~210만원/월	약 1,190~1,890만원	기본 생산 경로
개발비/서버비/기타	약 50만원/월	약 500만원	인프라, 예비, 운영
Grok API	`+a`	`+a`	`19금 성인 HL` 요구 프로젝트
합계		약 2,200~2,900만원 + a	운영 전환 1단계 총원가

이 표에서 중요한 점은 세 가지다.

- 1. `Vertex AI API`는 기본 운영비다.
- 2. `Grok +a`는 상시 비용이 아니라 예외 분기 비용이다.

3. '관리형 파인튜닝 비용'은 이 승인 범위의 기본 운영비에 포함하지 않는다.

운영 가정은 기존 승인요청서와 동일하게 유지한다.


1. Google API 실측 기준 '1 arc 약 9,000원'
2. 'Vertex Batch API' 병행 시 운영 가정 '1 arc 약 6,300원'
3. '작품당 70 arc', '월 3작품' 기준으로 Vertex 비용을 산정

2.4 왜 27작품 포트폴리오 기준으로 읽는가

승인 범위 자체가 월 3작품 x 9개월 = 총 27작품이기 때문이다. 그러면 총원가와 직접 비교하는 값도 27작품 포트폴리오의 출시 후 12개월 누적 순매출 분포여야 한다.

이 분포에서 이 선을 본다


남성향 60개월 실매출 기준 / 27작품 포트폴리오 / 출시 후 12개월 누적 순매출 분위

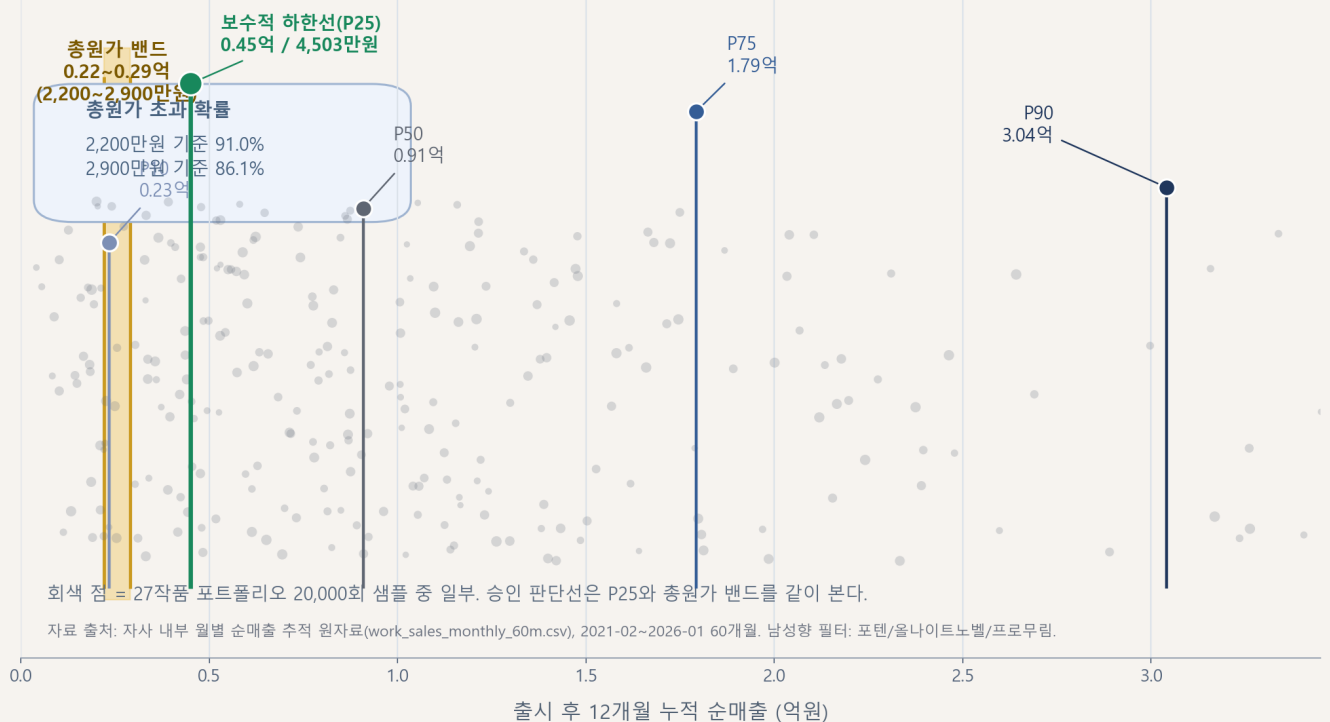

27작품 포트폴리오 손익 기준선

2026년 최소 생산 목표 = 27작품

승인 범위가 먼저 정해지고, 비용과 ROI 비교는 이 27작품 포트폴리오를 기준 단위로 읽는다.

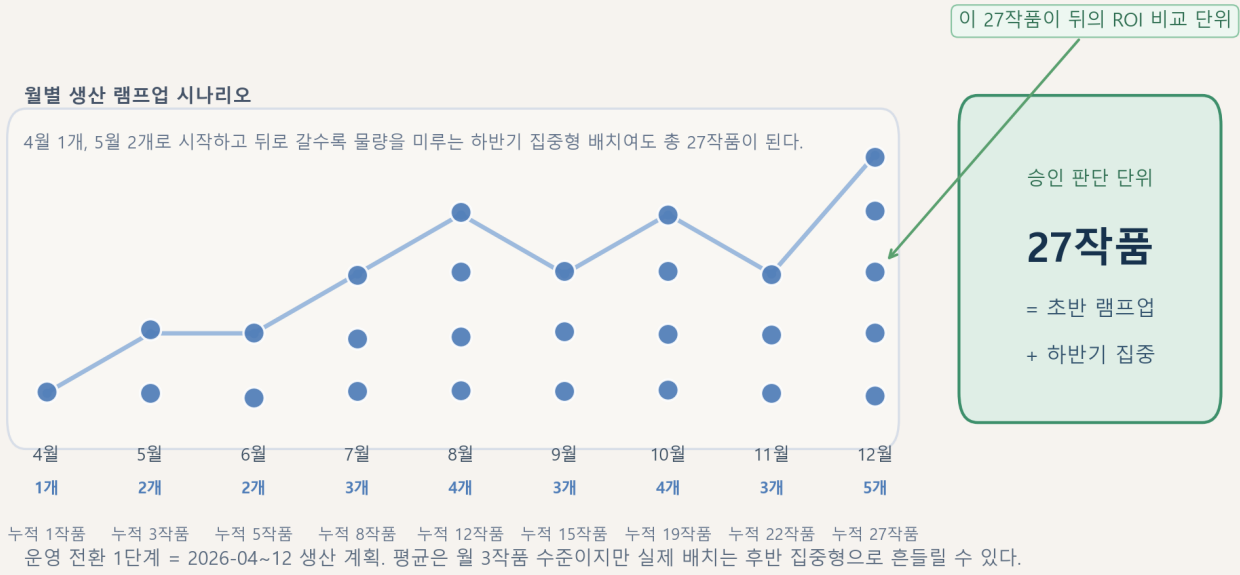

27작품 전제 차트

핵심 분포는 아래처럼 읽는다.

지표	값	해석
남성향 12개월 관측 완료 작품 수	1,699작품	내부 모집단
27작품 포트폴리오 P10	약 2,335만원	매우 보수적 구간
27작품 포트폴리오 P25	약 4,503만원	보수적 하한선
27작품 포트폴리오 P50	약 9,085만원	중위 기준선
27작품 포트폴리오 P75	약 1억 7,929만원	상단 구간
총원가 2,200만원 초과 확률	91.0%	보수적 전체 모집단 기준
총원가 2,900만원 초과 확률	86.1%	보수적 전체 모집단 기준

여기서 P25 4,503만원 > 총원가 2,200~2,900만원이라는 비교가 나온다. 이 비교는 2026년 안에 현금이 바로 들어온다는 뜻이 아니다. 의미는 하나다. 이번 승인 범위가 시장 기준선과 완전히 동떨어진 무리한 운영비나를 물을 때, 내부 남성향 순매출 자료로 볼 경우 그 답이 그 정도는 아니다라는 뜻이다.

2.5 재무팀이 먼저 걸 수 있는 시비와 답변

Q1. 왜 개별 작품 손익이 아니라 포트폴리오 기준인가

이번 승인 범위가 작품 1개가 아니라 월 3작품 x 9개월 = 27작품 운영 전환이기 때문이다. 비용도 포트폴리오 단위로 발생하므로, 매출 기준선도 포트폴리오 단위로 맞추는 것이 맞다.

Q2. 통계가 과대추정된 것 아닌가

보수적 가정을 일부러 택했다.

- 1. 모집단은 남성향으로만 좁혔다.
- 2. `12개월 관측 완료 작품`만 썼다.

3. '첫 관측월 = 첫 판매월'로 간주한 보수적 전체 모집단을 메인 기준선으로 썼다.
4. 승인 판단도 'P50'이 아니라 'P25'를 기준선으로 잡았다.

Q3. 통계가 과소추정된 것 아닌가

그 가능성도 있다. 하지만 승인 문서는 낙관 추정을 쓰는 자리가 아니라 최소한의 방어 가능한 기준선을 쓰는 자리다. 따라서 이 문서는 의도적으로 보수적으로 잡았다.

Q4. 고정비와 변동비를 섞어 부풀린 것 아닌가

아니다. 구독형 고정비, Vertex 운영형 변동비, Grok 예외 비용, 튜닝 실험비를 분리해서 읽어야 한다. 특히 Grok +a와 관리형 튜닝 실험비는 기본 운영비와 섞어 보면 안 된다.

Q5. Vertex 튜닝 비용이 뒤에서 폭발하는 것 아닌가

이 지적은 맞는 지적이고, 그래서 분리해서 적는다. 별도 메모 docs/2026-03-15/vertex-ai-gemini-tuning-cost-risk-note.md 기준으로, 전체 pseudo 코퍼스를 그대로 쓰는 Gemini 2.5 Pro supervised tuning은 3 epoch 약 685만 원 추정치가 나온다. 이 수치는 현재 승인 범위의 기본 운영비와 섞으면 안 된다.

현재 활성 튜닝 파일럿은 아래처럼 별도 통제한다.

1. 대상: '특정 현판 작품' 단일 작품 style-control 셋
2. 1 epoch 원화 참고치: 약 '52,035원'
3. 3 epoch 원화 참고치: 약 '156,106원'
4. 해석: '운영 전환 1단계 기본비'가 아니라 '사전 승인형 실험비'

따라서 재무팀 관점 결론은 아래와 같다.

기본 승인 범위는 '운영형 API 비용'을 승인받는 안건이고, 'Vertex 관리형 튜닝'은 별도 상한과 별도 파일럿 규칙으로 다뤄야 한다.

2.6 재무 판단 결론

재무적으로 이 안건은 당장 얼마 별까보다 27작품 포트폴리오를 운영 가능한 체계로 올릴 때, 기본 총원가가 내부 시장 기준선과 완전히 동떨어진 숫자냐를 보는 승인 요청이다. 현재 기준으로는 아래처럼 요약할 수 있다.

1. 기본 총원가 '약 2,200~2,900만원 + a'
2. '+a'는 'Grok' 예외 프로젝트에만 붙는 비용
3. 남성향 '60개월', '1,699작품', '27작품 20,000회 샘플링' 기준 'P25 약 4,503만원'
4. 해석은 '즉시 현금회수 보장'이 아니라 '운영 전환 1단계 예산이 완전히 무리한 숫자는 아님'

3. 기술적 판단

3.1 글도비는 정확히 무엇인가

글도비는 한 번 프롬프트 넣고 소설 한 화를 뽑는 도구가 아니다. 이 시스템은 IP 생산 인프라에 가깝다. 운영 개념상 핵심은 아래 네 가지다.

- 1. 작품 기획 정보를 구조화한다.
- 2. arc 단위로 설계한다.
- 3. 화별 blueprint를 만든다.
- 4. 원고 생성과 검수를 분리한다.

현재 파이프라인은 아래처럼 정리된다.

Treatment / Bible
-> Stage 0: 전처리 / 구조화
-> Stage 2: Arc 설계
-> Stage 3: Blueprint 생성
-> Stage 4: Manuscript 생성 및 심사

즉, 글도비의 본질은 AI 작가가 아니라 장편 웹소설을 통제 가능한 절차로 생산하기 위한 시스템이다.

3.2 지금 단계는 어디인가

현재 단계는 Production이 아니다. 아래처럼 구분해야 한다.

단계	의미	현재 판단
POC	아이디어 수준 구현	통과
Technical Validation	파이프라인 자체가 동작하는지 검증	통과
MVP Validation	실프로젝트 수준의 연속 생산으로 최소 가치 검증	현재 단계
Pre-Production	실운영 직전 비용, 안정성, 품질 최종 검증	미도달
Production	상업 운영 체계	미도달

현재 단계를 MVP Validation 진행 중으로 보는 근거는 아래와.

- 1. `00\_test\_00` 기준 `1 arc / 4화`에서 Stage 2 -> 3 -> 4 end-to-end 재현을 확인했다.
- 2. `2026-03-11 승인 근거 패키지` 기준 `3,800건대 테스트 통과 기록`과 전수조사 묶음이 확보되어 있었다.
- 3. `10 arc 연속 통과` 전제에서 다수 arc 연속 생산, 품질 게이트 동작, 운영 로그 축적이 확인되었다.

반대로 아직 안 된 것도 명확하다.

- 1. 실프로젝트 1건 상업 검증
- 2. `70 arc 이상` 장기 비용곡선 실측
- 3. `19금 성인 HL` 프로젝트의 `Grok +a` 실측
- 4. `Production` 단계의 인력, 책임, SLA 수준 운영

3.3 왜 `hierarchical pipeline + planning-execution loop`를 택했는가

장편 웹소설 시스템에서 문제는 한 문단 잘 쓰기가 아니라 수백 화 동안 계획, 상태, 시점, 장면 전환, 회수 타이밍을

관리하는 것이다. 이 문제를 풀려면 먼저 계획하고, 그 계획대로 쓰고, 검수 후 다시 수정하는 구조가 필요하다.

글도비는 이 요구 때문에 hierarchical pipeline + planning-execution loop를 택했다.

1. `Stage 0`에서 입력 기획을 구조화한다.
2. `Stage 2`에서 arc 목표와 진행을 설계한다.
3. `Stage 3`에서 화별 blueprint와 scene breakdown을 만든다.
4. `Stage 4`에서 원고를 생성하고 심사, advisory, validation을 거친다.

이 선택은 취향 문제가 아니라 장편 운영의 공학적 선택이다. 무작정 길게 이어쓰기로는 아래 문제가 바로 온다.

1. arc 목표가 사라진다.
2. 회차 역할 분리가 흐려진다.
3. 복선과 회수 타이밍이 흔들린다.
4. 디버깅 포인트가 문장 내부에 묻힌다.

3.4 왜 `rolling memory writer`를 주 아키텍처로 두지 않았는가

이 문서에서 말하는 rolling memory writer는 공식 논문 taxonomy가 아니라 운영상 묶음 이름이다. 뜻은 직전 본문 + 요약 메모리 + retrieval 조각을 계속 굴리며 순차 생성하는 구조다.

이 접근은 짧은 길이나 보조 기억 수준에서는 유용하지만, 250화 이상 장편의 주 아키텍처로 두기에는 약점이 크다.

1. 요약 손실이 누적된다.
2. retrieval miss가 잠복해도 늦게 드러난다.
3. 거시 계획이 약해진다.
4. 실패 시 원인 추적이 어렵다.
5. 좋은 문장을 쓴다고 해서 좋은 장기 구조가 자동으로 나오지 않는다.

그래서 글도비는 hierarchy가 빠대, memory/retrieval은 보조라는 방향을 잡는다. 즉, memory는 필요하지만 빠대 역할을 맡기지 않는다.

3.5 이 방향이 이상한 갈래가 아닌 이유

이건 혼자 이상한 방향으로 간 것이 아니다. 최근 장문 생성 연구도 대체로 아래 방향으로 수렴한다.

1. `outline / planning / chapter-scene decomposition`
2. `memory / summarization / retrieval`
3. `specialized agent` 또는 `revision loop`

글도비는 이 셋 중 첫 번째를 빠대로 택하고, 두 번째를 보조로 쓰며, 세 번째를 운영적 심사 구조로 부분 수용하는 편이다. 즉, 장편 생성의 주류 문제설정과 어긋난 구조가 아니라, 실무형으로 재조합한 구조다.

관련 설명 근거는 아래 파일에 정리돼 있다.

- `docs/2026-03-11/TF-250-can-system-produce-250ep-report.md`
- `docs/2026-03-15/vertex-ai-gemini-tuning-cost-risk-note.md`
- `modules/validation/validation\_orchestrator.py`
- `modules/core/stage4\_interview\_round.py`

3.6 지금 검증된 것과 아직 미검증인 것

구분	검증 상태	의미
파이프라인 동작	검증됨	Stage 0/2/3/4 end-to-end 가능
다수 arc 연속 운용	검증됨	`10 arc 연속 통과` 전제 확보
250화 구조적 가능성	검증됨	재설계급 하드 블로커 `0건` 판단
장기 상업 운영	미검증	실프로젝트, 70 arc+, ROI 실측 필요
19금 HL 대응 비용	미검증	`Grok +a` 실측 필요
관리형 튜닝의 비용 대비 효과	미검증	소형 파일럿부터 별도 승인 필요

개발부서 관점에서 핵심 결론은 단순하다.

글도비는 `Production 인증 완료 시스템`은 아니지만, `운영 전환 여부를 논할 수 있는 수준의 MVP Validation 단계`에는 들어왔다. 따라서 지금 요청하는 것은 전면 서비스 개시가 아니라, `회사 체계로 올려도 되는가`를 판단하는 1차 승인이다.

4. 승인 조건 및 실행 계획

4.1 이번 승인 범위

이번 승인 범위는 아래로 제한한다.

- 1. `2026-04~12` 운영 전환 1단계 예산 `약 2,200~2,900만원 + a` 상한
- 2. `Vertex AI` 운영 계정, 예산 한도, `Batch API` 활용 승인
- 3. `월 3작품` 기준 운영 검증 권한
- 4. `19금 성인 HL` 요구 프로젝트 발생 시 `Grok +a` 예외 분기 승인
- 5. 결과물 권리 구조와 운영 책임 체계 확정

4.2 승인 조건

조건은 넓게 열지 않고 아래처럼 묶어야 한다.

- 1. 예산 상한: 기본 운영비는 `2,200~2,900만원 + a` 범위를 넘기지 않는다.
- 2. 프로바이더 범위: 기본 생산 경로는 `Vertex AI`, 예외 프로젝트만 `Grok +a`.
- 3. 인간 감수 범위: 단기 운영에서는 인간 감수를 유지한다.
- 4. 튜닝/실험 경계: `관리형 튜닝`은 기본 운영비와 분리해 별도 승인한다.
- 5. 비용 관측: `Batch API`, usage, latency, error, 비용 귀속을 운영 지표로 남긴다.

4.3 승인 후 점검 항목

승인 후 바로 봐야 할 것은 아래다.

- 1. 실제 프로젝트 `1건` 운영 로그
- 2. `70 arc 이상` 장기 비용곡선
- 3. `Grok +a` 예외 프로젝트 실측
- 4. 실프로젝트 `1건` 상업 성과 및 ROI 실측
- 5. 품질 게이트 reject율과 재시도 비용 편차

4.4 월별 및 분기별 실행 계획

기간	목표	해석
2026.04	운영 전환 1단계 시작	계정, 권한, 비용 귀속, 기본 생산 경로 확정
2026.05~06	작품 생산 가능성 closure	월 3작품 기준 운영 로그 확보
2026.07~08	퀄리티 업 1차	품질 게이트, 라우팅, retry 비용 최적화
2026.09~10	퀄리티 업 2차	장기 비용곡선, 유통/피드백 반영
2026.11~12	다음 단계 판단	Pre-Production 진입 여부와 별도 튜닝 파일럿 판단

4.5 승인 거절 시 실제로 막히는 것

승인을 미루면 아래가 같이 지연된다.

- 1. 회사 운영 체계 안에서의 권한 통제

2. 비용 귀속과 모니터링 체계 구축
3. `Vertex AI` 기반 운영 최적화 검증
4. 실전 로그 누적 속도
5. `작품 생산 가능성 -> 퀄리티 업` 단계 전환 일정

즉, 승인 거절의 의미는 리스크 회피만이 아니다. 회사 자산화 지연과 검증 지연을 같이 선택하는 것이다.

5. 부록

5.1 이 문서를 뒷받침하는 핵심 파일

재무 판단 근거:

- `work\_sales\_monthly\_60m.csv`
- `work\_sales\_monthly\_by\_work\_60m\_male\_only.csv`
- `work\_sales\_work\_profile\_male\_only.csv`
- `work\_sales\_roi\_portfolio\_baseline\_male\_only.csv`
- `docs/2026-03-11/business-approval-context-research.md`

기술 판단 근거:

- `docs/2026-03-11/TF-250-can-system-produce-250ep-report.md`
- `docs/2026-03-11/프로젝트승인요청서-글도비.md`
- `modules/validation/validation\_orchestrator.py`
- `modules/core/stage4\_interview\_round.py`

튜닝 비용 메모:

- `docs/2026-03-15/vertex-ai-gemini-tuning-cost-risk-note.md`

5.2 이 문서가 의도적으로 주장하지 않는 것

이 문서는 아래를 주장하지 않는다.

1. 글도비가 이미 `Production` 인증을 받았다는 주장
2. 실프로젝트 수익성이 이미 검증되었다는 주장
3. `관리형 튜닝`이 지금 당장 반드시 필요하다는 주장
4. `인간 감수 제거`가 지금 즉시 시행된다는 주장
5. 모든 장르, 모든 요구사항에서 원가와 품질이 동일하다는 주장

5.3 문서의 최종 해석

이 문서는 AI 소설 도입 제안서가 아니라, MVP Validation 단계에 들어선 장편 IP 생산 시스템을 회사 운영 체계로 올릴 것인지 묻는 첫 승인 요청서다. 첫 페이지는 임원 판단용, 이후 페이지는 재무/개발 공격 방어용으로 읽으면 된다.

5.4 3pass 감리 메모

이 문서는 아래 기준으로 재감리했다.

1. Pass 1 구조 감리: `1페이지 요약 -> 목차 -> 재무 -> 기술 -> 승인 조건 -> 부록` 구조가 결재 문서 목적과 맞는지 점검했다.
2. Pass 2 근거 감리: `1페이지는 기존 승인서 중심`, `2페이지 이후는 방어형 본문 중심`이라는 편집 원칙 아래 `60개월 매출 자료`, `27작품 포트폴리오 기준선`, `튜닝 비용 메모`, `Stage 0/2/3/4 구조`, `250화 구조 검토 문서`와 수치 및 파일명을 다시 대조했다.
3. Pass 3 실행 감리: PDF 렌더 기준 `1페이지 요약 전용`, `2페이지 목차`, `3페이지 재무 시작`이 실제로 유지되는지, 그리고 `운영비와 튜닝비 분리`, `Production 아님`, `인간 감수 유지`, `승인 후 점검 항목`이 실제 의사결정 문서로

충분한지 점검했다.

감리 후 최종 판단은 아래와 같다.

- 이 문서는 '전면 상업 운영 승인서'가 아니라 '운영 전환 1단계 승인서'로 읽혀야 한다.
- 숫자의 핵심은 '27작품 포트폴리오', '기본 총원가 2,200~2,900만원 + a', 'P25 4,503만원', '튜닝비 별도'다.
- 기술의 핵심은 'hierarchical pipeline + planning-execution loop', 'MVP Validation', 'rolling-memory 단독 아님'이다.
